



RN25 - Requalification de l'échangeur nord d'Amiens entre les RN25 et RN1 Début de la deuxième phase des travaux

Une requalification pour plus de sécurité

L'Etat a engagé la requalification de l'échangeur nord d'Amiens (n°38) depuis juin 2021 par le quart Nord-Est.

De septembre à décembre 2021, la deuxième phase des travaux se déroule sur le quart Nord-Ouest de l'échangeur.

Pour rappel, la solution retenue consiste en un réaménagement de l'échangeur actuel en un diffuseur de type « lunettes » qui facilitera les échanges et donnera leur place aux modes actifs.

 Vers Amiens

 Véloroute voie verte



Vers Poulainville 

Retour en images sur les travaux de la phase 1




Plus d'info :
RN25.fr

Une requalification en 5 phases

Phase 2

Les travaux concernent le quart Nord-Ouest de l'échangeur. Ils permettront de créer le nouveau giratoire Nord ainsi que la Véloroute et Voie Verte le long de la RN25 jusqu'à Poulainville.

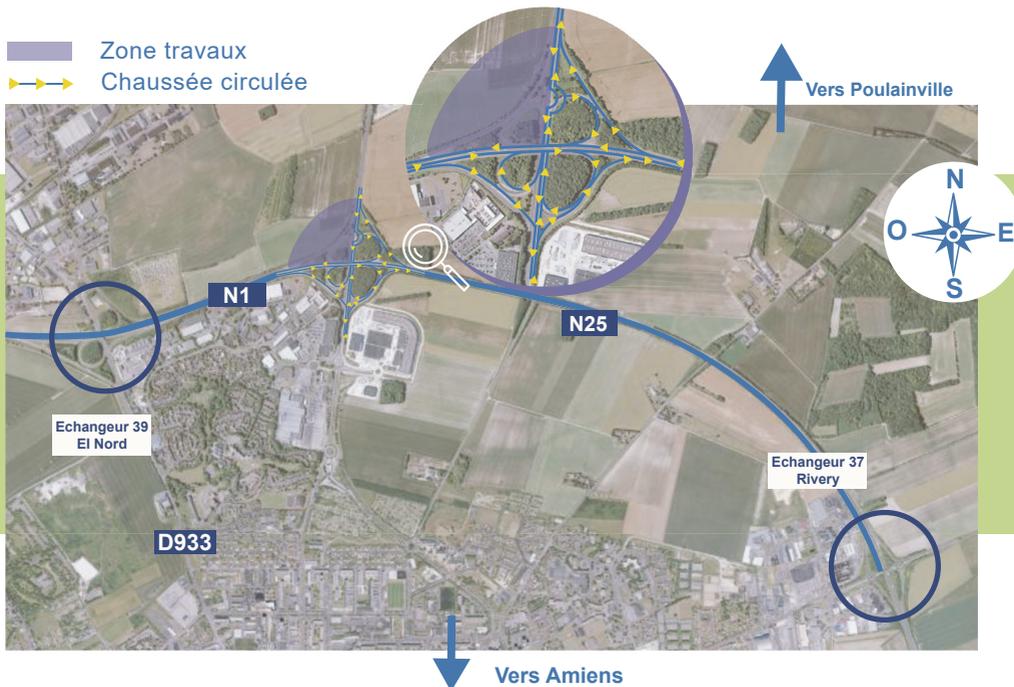


Les déviations mises en place à partir de septembre 2021

Les « nouvelles » bretelles du quart Nord-Est seront ouvertes à la circulation dans le sens Longueau vers Doullens et Amiens vers Abbeville.


Les bretelles du quart Nord-Ouest seront définitivement fermées à la circulation (en rouge sur les cartes) avec la mise en place des déviations suivantes :

- De Doullens vers Abbeville : demi-tour au giratoire de l'avenue de l'Europe puis nouvelle bretelle Nord-Est.
- De Longueau vers Amiens Centre : sortie par la nouvelle bretelle Nord-Est et demi-tour au giratoire de Poulainville.

■ De Doullens vers Abbeville

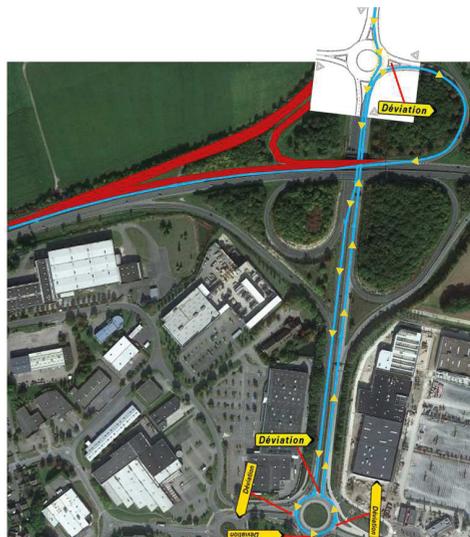

■ Déviation de Longueau vers Amiens centre

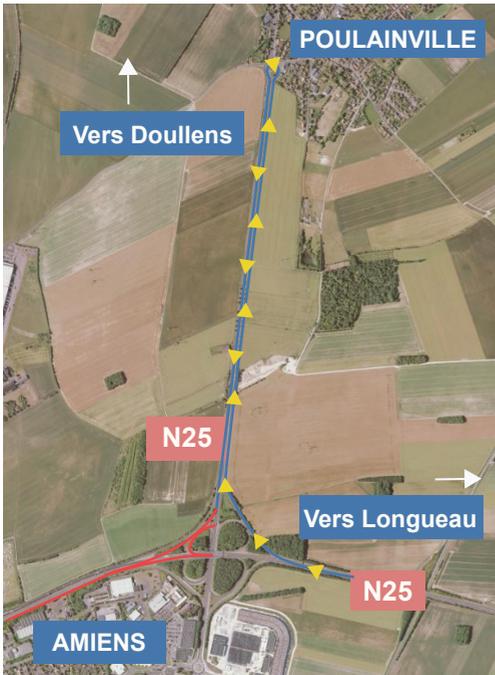

Les itinéraires de délestage

> Itinéraire S1

Du Nord vers l'Ouest (Doullens vers Abbeville) : depuis Villers-Bocage par Flesselles via RD113/933.

> Itinéraire S2

Du Sud vers l'Ouest via la RD933 pour rejoindre l'échangeur 39 depuis Amiens centre.

S1



S2



Financement de l'opération dans le cadre du CPER* 2015-2020

- Coût prévisionnel : 5 M€
- Etat : 77,5 %
- Amiens Métropole : 22,5 %
* Contrat de Plan Etat-Région

Intervenants

- Maîtrise d'ouvrage : DREAL Hauts- de-France
- Maîtrise d'œuvre : VERDI Nord-Pas de Calais
- Entreprises : COLAS - AXIMUM

Planning prévisionnel

2021

Juin

Septembre

Décembre

Phase 1 : réalisation du quart Nord-Est de l'échangeur

Phase 2 : réalisation du quart Nord-Ouest de l'échangeur et mise en service du giratoire Nord

2022

Janvier

Avril


Juin

Été

Phase 3 : réalisation du quart Sud-Est de l'échangeur

Phase 4 : réalisation du quart Sud-Ouest de l'échangeur et mise en service du giratoire Sud

Phase 5 : réfection de la couche de roulement de la rocade et finitions

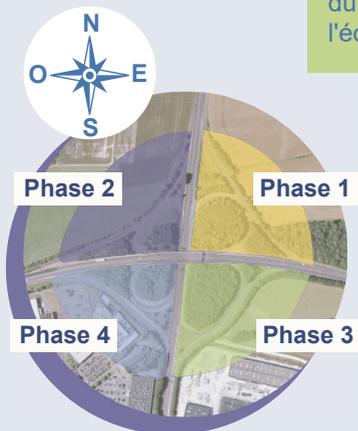

Retrouvez toutes les informations sur le projet sur le site internet de la DREAL rn25.fr
DREAL Hauts-de-France 56, rue Jules Barni 80040 AMIENS Cedex 1
Tél : 03 22 82 92 07
